Actas del cierre del Sprint 1

Sprint 1 extendido por el docente: del 15/10 al 05/11/2026. Equipo: Fernando Istaña (Scrum Master · despliegue, web e integraciones), Víctor Adiel Luján (Product Owner · backend y base de datos), Henry Ticona (web y pruebas), Nicolás Pachamora (app Android).

> Las cifras salen del Registro del Sprint 1, el Burndown y las pruebas de aceptación del 04 y 05/11. Lo marcado [completar en la sesión] se llena durante la reunión: no se escribe antes lo que todavía no se dijo.

Acta 1 · Sprint Review

Dato	Valor
Fecha	Jueves 05/11/2026
Hora	[completar en la sesión]
Lugar o modalidad	[completar en la sesión]
Asistentes	Fernando Istaña (SM), Víctor Adiel Luján (PO), Henry Ticona, Nicolás Pachamora · Docente: Omar Loaiza · Cliente: [completar en la sesión]
Duración	Objetivo: 30 minutos (máximo 1 hora por cada semana de sprint, según la Guía Scrum)

1. Objetivo del Sprint 1 y si se cumplió

Objetivo: poder controlar los recursos de la obra, desde lo que pide el S10 hasta lo que se compra, se consume y cuesta.

Resultado: cumplido en parte. Se cumplió el tramo inicial del recorrido: preparar la obra, su catálogo y su requerimiento importados del S10 real, los proveedores, el acceso con roles y el registro de salidas sin señal desde la app. **No** se cumplió el tramo de compra, recepción, stock valorizado y comparación con el S10. Ese tramo es ahora el objetivo del Sprint 2.

2. Métricas del sprint

Indicador	Comprometido	Terminado	%
Historias de usuario	29 (153 puntos)	16 (77 puntos)	55 % de las HU · 50 % de los puntos
Historias técnicas	10	7	70 %
Tareas	270	205 (6 en Doing, 59 en To Do)	76 %
Velocidad	—	77 puntos	Base para el Sprint 2

Burndown: en tareas bajó con tramos planos (fines de semana y trabajo en curso); en puntos quedó plano hasta el 04/11, porque una historia suma solo cuando su tarea de aceptación está en Done. Ver «Burn Down Chart Sprint 1» y el Tablero Scrum por cortes.

3. Incremento demostrado (desde la interfaz, en el ambiente de pruebas)

HU	Qué se mostró	Pts	Done	Decisión del PO
HU-01	Crear la obra con plazo; fin ≥ inicio	3	04/11	Aceptada con observaciones (D01)
HU-03	Semanas generadas al crear la obra	3	04/11	Aceptada con observaciones (D02–D04)

HU	Qué se mostró	Pts	Done	Decisión del PO
HU-07	Importar la Relación de insumos del S10: 284 filas, 0 fallidas; repetir no duplica	8	04/11	Aceptada con observaciones (D05)
HU-08	Alta de insumo con duplicado rechazado	5	04/11	Aceptada con observaciones (D08–D09)
HU-19	Requerimiento total de la obra importado	5	04/11	Aceptada con observaciones (D10–D12)
HU-24	Saldo por comprar con exportación	3	04/11	Aceptada con observaciones (D13–D14)
HU-25	Stock de seguridad y punto de reposición	5	04/11	Aceptada con observaciones (D06–D07)
HU-29	Búsqueda sobre los proveedores reales	3	04/11	Aceptada con observaciones (D15–D16)
HU-30	Alta de proveedor desde la compra, RUC único	3	04/11	**Aceptada: cumple todo**
HU-12	Inicio de sesión (Argon2id, sesión de 8 h)	5	05/11	Aceptada con observaciones (D17)
HU-13	Asignar roles	5	05/11	Aceptada
HU-14	Asignar usuarios a obras	3	05/11	Aceptada
HU-15	Autorizar el celular de la obra (un solo activo)	5	05/11	Aceptada
HU-37	Registrar en la app sin señal	8	05/11	Aceptada
HU-38	Sincronizar pendientes: se envía una sola vez	5	05/11	Aceptada
HU-40	Registrar salida de material; sin stock se rechaza con su motivo	8	05/11	Aceptada

Cada HU fue probada por alguien distinto de su autor, con evidencia: «Pruebas de aceptación (04-11)» y la carpeta de evidencias del 05/11. Las 17 observaciones quedaron como defectos en el Registro de incidencias y pasan al Sprint 2 como HT-11.

4. Lo que no se terminó

HU	Historia	Tareas hechas	Destino
HU-32	Registrar compras	5 de 8	Sprint 2
HU-35	Recibir compras	5 de 9	Sprint 2
HU-17	Convertir unidades	4 de 7	Sprint 2
HU-43	Consultar stock	6 de 10	Sprint 2
HU-45	Corregir movimientos	5 de 8	Sprint 2
HU-55	Valorizar salidas	5 de 8	Sprint 2
HU-57	Comparar consumo vs. lo planificado	3 de 8	Sprint 2
HU-23	Consultar compra y consumo	5 de 8	Sprint 2
HU-16	Importar precios unitarios (APU)	2 de 8	Siguiente iteración
HU-26	Avisar cuándo reponer	3 de 9	Siguiente iteración
HU-27	Sugerir cuánto comprar	3 de 8	Siguiente iteración
HU-62	Registrar trabajadores	5 de 8	Siguiente iteración
HU-63	Tomar asistencia	5 de 8	Siguiente iteración

HT pendientes: HT-03 (repositorio privado), HT-06 (OpenAPI publicado) y HT-09 (revisión de la migración 0009). Pasan al Sprint 2.

5. Respuesta a las observaciones del docente del 29/10

Observación	Qué se hizo
Tablero en tres cortes al día	Tablero Scrum D1–D22 a las 08:00, 12:00 y 18:00, con DoR y DoD en cada corte y el Burndown en el mismo archivo
Ninguna HU llegaba a Done	Pruebas de aceptación cruzadas el 04 y 05/11 → 16 HU en Done
Explicar el código y la arquitectura	Guía de defensa técnica: cada integrante explica su parte
Respaldar con autores	Cada decisión con su autor (Guía Scrum, Cohn, Richardson, Brown, Nygard, ISO/IEC 25010)

6. Cambios al Product Backlog

- Product Backlog v7 (decisión D9): repriorizado por la velocidad real. Sprint 2 = 16 HU, 78 puntos; el resto pasa a «Siguiente iteración».
- HU nuevas que salieron de las pruebas de la app: HU-66 desbloqueo con PIN, HU-67 foto de evidencia, HU-68 incidencia de material (por votar).

7. Comentarios del docente y del cliente

[completar en la sesión]

[completar en la sesión]

8. Acuerdos de la Review

[completar en la sesión]

_____
Fernando Istaña — Scrum Master

_____
Víctor Adiel Luján — Product Owner

Acta 2 · Sprint Retrospective

Dato	Valor
Fecha	Jueves 05/11/2026, después de la Review
Hora	[completar en la sesión]
Participantes	Solo el Scrum Team: Fernando Istaña (facilita), Víctor Adiel Luján, Henry Ticona, Nicolás Pachamora
Para qué	Es una reunión nuestra, no una rendición de cuentas: mirar cómo trabajamos como equipo y decidir qué cambiamos. Lo que se dice aquí es cualitativo; los KPI de la sección 7 solo ponen números a lo que sentimos.

1. Cómo nos sentimos (el sentir del grupo)

Terminamos el Sprint 1 con una mezcla de cansancio y orgullo. Orgullo porque el sistema funciona con los datos reales de la obra: el S10 se importa al céntimo y la app registra sin señal y no duplica nada. Cansancio porque casi todo se cerró en los últimos dos días, a contrarreloj, después de veinte días sin ninguna historia en Done.

La frase que mejor lo resume la dijimos nosotros mismos: **fuimos obreros que construyeron sin mirar los planos.** Hicimos los diagramas UML y las pantallas, pero al programar no los usamos, y eso nos costó 17 defectos. También sentimos que el trabajo no estuvo bien repartido: dos personas cargaron con la mayor parte de las tareas terminadas.

Salimos con una idea clara: **el Sprint 2 es nuestra redención.** No queremos hacer más, queremos terminar lo que prometemos y construir siguiendo los planos.

> Cada integrante, en una frase, cómo vivió el sprint (se escribe en la reunión):

Fernando: [completar en la sesión]

Adiel: [completar en la sesión]

Henry: [completar en la sesión]

Nicolás: [completar en la sesión]

2. Qué hicimos bien

- Trabajamos con los reportes reales del S10 y los proveedores reales desde el inicio; nada se probó con datos inventados.
- Nadie probó lo que programó: las pruebas cruzadas, con evidencia, nos dieron una aceptación honesta.
- Cuando el ambiente se cayó por memoria no adivinamos: medimos, encontramos la causa (Argon2id) y lo dejamos como decisión en el ADR-10.
- Reconocimos los errores en el Registro de incidencias en vez de esconderlos.
- Protegimos la rama main para que nadie fusione sin revisión.

3. Qué no hicimos

- No seguimos los diagramas UML ni las pantallas del lienzo al programar.
- No probamos cada historia al terminarla: todas las pruebas se hicieron el 04 y 05/11.
- No movimos el tablero en el momento: del 15 al 22/10 se registró en bloque.
- No revisamos todos los PR antes de fusionarlos (#8, #31, #35 y #38).
- No repartimos el trabajo de forma pareja ni pedimos ayuda a tiempo cuando alguien se atrasaba.
- No medimos nuestra capacidad antes de comprometernos con 29 historias.

4. Qué volveríamos a hacer

- Usar los datos reales del cliente desde el primer día.
- Las pruebas cruzadas con evidencia (probador distinto del autor).
- Medir antes de decidir y dejar la decisión escrita (como el ADR-10).
- Registrar las incidencias con su impacto y su solución.
- La Daily corta y el tablero en tres cortes al día.

5. Qué no haríamos

- Programar sin abrir el diagrama UML y la pantalla de la historia.
- Dejar todas las pruebas y la aceptación del PO para el último día.
- Comprometer más puntos de los que nuestra velocidad permite.
- Fusionar un PR sin la aprobación de otro integrante.
- Llenar el tablero o la bitácora días después.

6. Qué aprendimos

- **Una historia no está hecha hasta que el PO la acepta.** Tener el 76 % de las tareas hechas no es tener el 76 % del producto: en puntos solo llegamos al 50 %.
- **El diseño es el plano, no un entregable aparte.** Si no se usa al construir, solo sirvió para la nota.
- **Probar en el ambiente real destapa lo que el código solo no muestra** (la memoria, el acero en kg, lo comprado en 0).
- **La velocidad se mide, no se supone.** Ahora sabemos que rendimos unos 77 puntos y planificamos con ese número.
- **Pedir ayuda a tiempo es parte del trabajo.** Una tarea bloqueada que nadie sabe que está bloqueada atrasa a todos.

7. KPI del Sprint 1: lo terminado frente al Sprint Backlog

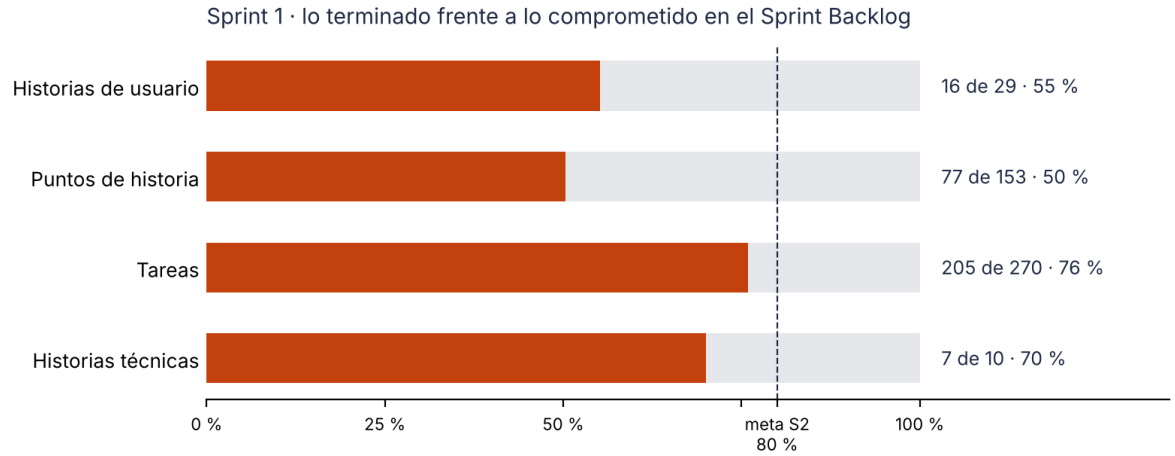


Figura 1. Cumplimiento del Sprint Backlog 1. La meta del Sprint 2 es 80 % o más.

KPI	Cómo se calcula	Sprint 1	Qué nos dice	Meta Sprint 2
Cumplimiento del compromiso (HU)	HU en Done ÷ HU del Sprint Backlog	16 ÷ 29 = **55 %**	Prometimos casi el doble de lo que terminamos	≥ 80 % (13 de 16)
Cumplimiento en puntos (say/do)	Puntos en Done ÷ puntos comprometidos	77 ÷ 153 = **50 %**	La mitad del valor comprometido no llegó	≥ 80 %
Velocidad	Puntos de las HU en Done	**77**	Nuestra capacidad real; base para planificar	Estable: 70–85

KPI	Cómo se calcula	Sprint 1	Qué nos dice	Meta Sprint 2
Avance de tareas	Tareas en Done ÷ tareas del sprint	205 ÷ 270 = **76 %**	Mucho trabajo hecho que no se convirtió en HU terminadas	La brecha con el KPI en puntos ≤ 10 puntos porcentuales
Trabajo arrastrado	Puntos de HU no terminadas ÷ puntos comprometidos	76 ÷ 153 = **50 %**	13 HU vuelven al backlog con 56 de sus 107 tareas hechas	≤ 20 %
Aceptación limpia	HU aceptadas sin observaciones ÷ HU en Done	1 ÷ 16 = **6 %**	Casi todo pasó con defectos	≥ 50 %
Densidad de defectos	Defectos de la aceptación ÷ HU en Done	17 ÷ 16 = **1,06 por HU**	Más de un defecto por historia	≤ 0,5 por HU
Días hasta la primera HU en Done	Día del sprint en que la primera HU llega a Done	**Día 21 de 22**	Todo el valor se entregó al final	Antes del día 5 (≤ 10/11)
Concentración del cierre	Puntos cerrados en los 2 últimos días ÷ puntos en Done	77 ÷ 77 = **100 %**	Trabajamos en cascada dentro del sprint	≤ 40 %
Historias técnicas	HT terminadas ÷ HT del sprint	7 ÷ 10 = **70 %**	Lo técnico avanzó mejor que lo funcional	100 % de las 5 HT
Reparto de la carga	Tareas en Done de cada uno ÷ total en Done	Adiel 40 % · Fernando 39 % · Henry 10 % · Nicolás 10 %	Dos personas cargaron el 80 %	Nadie por encima del 35 %
Cumplimiento de la DoD en los PR	PR fusionados sin aprobación de otro integrante	**4 PR**	Se saltó la revisión (T1 de la DoD)	0 (lo asegura el ruleset de main)

Cómo se miden en el Sprint 2: el Sprint Backlog 2 y el Registro ya cuentan HU, puntos y tareas por estado; el Burndown en puntos muestra cuándo llega cada HU a Done. El Scrum Master actualiza esta tabla en la Daily del 12/11 (mitad del sprint) y al cierre.

8. Acuerdos para el Sprint 2 (máximo 3, con dueño)

N.°	Acuerdo	Dueño propuesto	KPI que lo comprueba
1	Probar y aceptar cada HU apenas se termina: ninguna HU espera más de 2 días en «Pruebas»	Henry (pruebas) y Adiel (PO)	Días hasta la primera HU en Done · concentración del cierre
2	Antes de pasar a Doing una tarea de desarrollo, revisar el diagrama UML y la pantalla de su HU; en el PR se compara con la pantalla	Cada developer · lo verifica quien revisa el PR	Aceptación limpia · densidad de defectos
3	Mover el tablero en el momento y avisar en la Daily cualquier bloqueo; quien termina antes ayuda al que va atrasado	Fernando (SM)	Reparto de la carga · cumplimiento del compromiso

Votación de los acuerdos: [completar en la sesión]

9. Velocidad y replanificación

Velocidad del Sprint 1: **77 puntos**. El Sprint 2 (06/11 al 19/11) compromete **16 HU y 78 puntos**. Pesa igual que la velocidad aunque dura 14 días, porque las 8 HU que vuelven ya traen 38 de sus 66 tareas hechas. El objetivo es el recorrido de la compra al costo de la obra.

_____	_____
Fernando Istaña — Scrum Master	Víctor Adiel Luján — Product Owner
